



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0756- 2024

**OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS Terciarias DE LOS
CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**

LOTE # 3

SOCIALIZACIÓN PANCE




CONSORCIO FONTANA 2024
www.cali.gov.co/infraestructura



COP16
CALI-COLOMBIA
Paz con la Naturaleza

P2. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, VEREDA LA VORÁGINE, ARCA DE NOE CORREGIMIENTO DE PANCE

DIRECCIÓN: VEREDA LA VORAGINE SECTOR ARCA DE NOE BARRIO / COMUNA / CORREGIMIENTO: PANCE - COMUNA 53					
COORDENADAS (Magna Sirgas)	INICIO	FINAL	LONGITUD	M	838
	Este (X): 1052820,44	Este (X): 1053523,04	AREA	M2	0
	Norte (Y): 860630,43	Norte (Y): 861054,62			

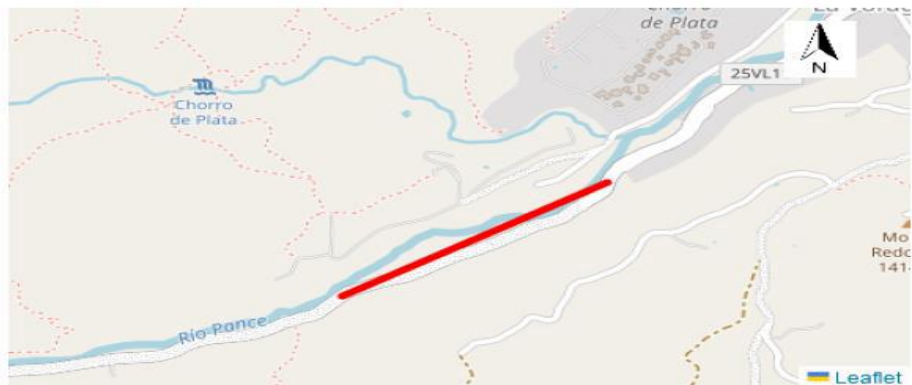

P2. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, VEREDA LA VORÁGINE, ARCA DE NOE CORREGIMIENTO DE PANCE


Item de Pago	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
	FRENTE # 2 - PANCE - VEREDA LA VORAGINE SECTOR ARCA DE NOE	38.75 días	mar 15/10/24	mar 10/12/24	\$ 116,961,400.00
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES	4 días	mar 15/10/24	vie 18/10/24	\$ 3,989,718.00
3	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	4 días	mar 15/10/24	vie 18/10/24	\$ 3,989,718.00
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE	18.75 días	mié 16/10/24	mié 13/11/24	\$ 14,312,438.00
15	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	8 días	mié 16/10/24	vie 25/10/24	\$ 4,981,316.00
21	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL.	5.75 días	lun 28/10/24	mié 13/11/24	\$ 8,539,150.00
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	3 días	lun 28/10/24	mié 30/10/24	\$ 791,972.00
IV	RELLENOS Y BASES	11 días	mié 13/11/24	jue 28/11/24	\$ 19,050,512.00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	5 días	mié 13/11/24	mié 20/11/24	\$ 5,301,040.00
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	9 días	vie 15/11/24	jue 28/11/24	\$ 13,749,472.00
XI	DRENAJES	15 días	mar 19/11/24	mar 10/12/24	\$ 79,608,732.00
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO FC=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	15 días	mar 19/11/24	mar 10/12/24	\$ 79,608,732.00

VALOR FRENTE DE OBRA = \$116.961.400




P2. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, VEREDA LA VORÁGINE, ARCA DE NOE CORREGIMIENTO DE PANCE

INFRAESTRUCTURA

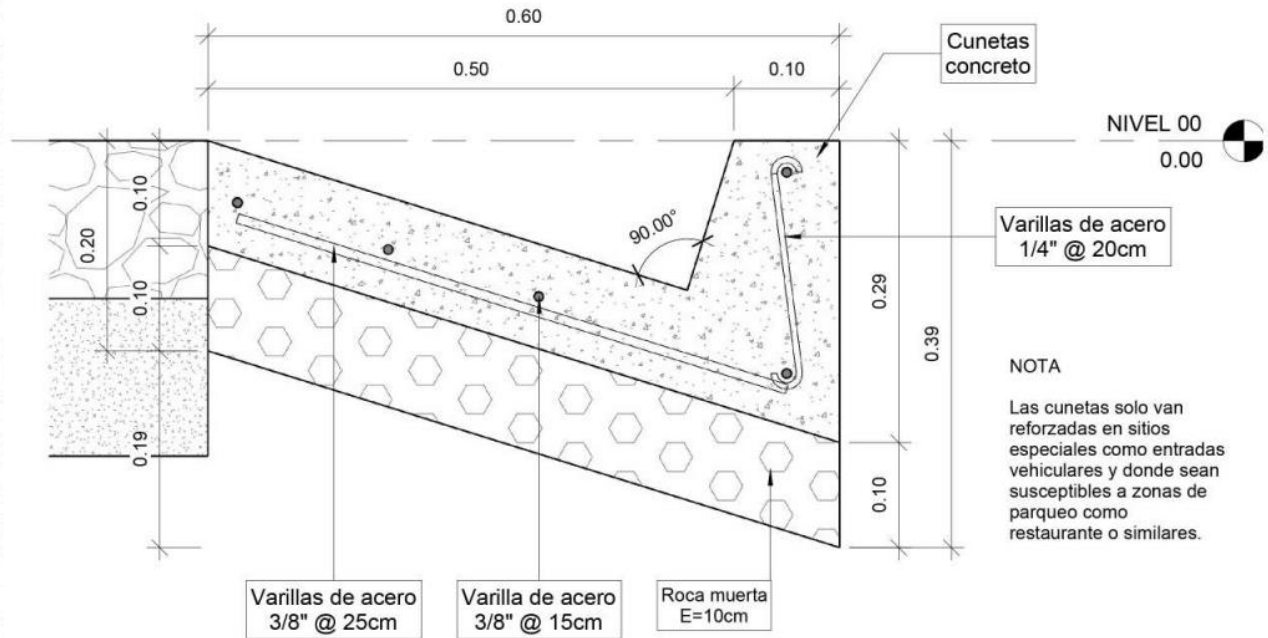

P2. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, VEREDA LA VORÁGINE, ARCA DE NOE CORREGIMIENTO DE PANCE

INFRAESTRUCTURA

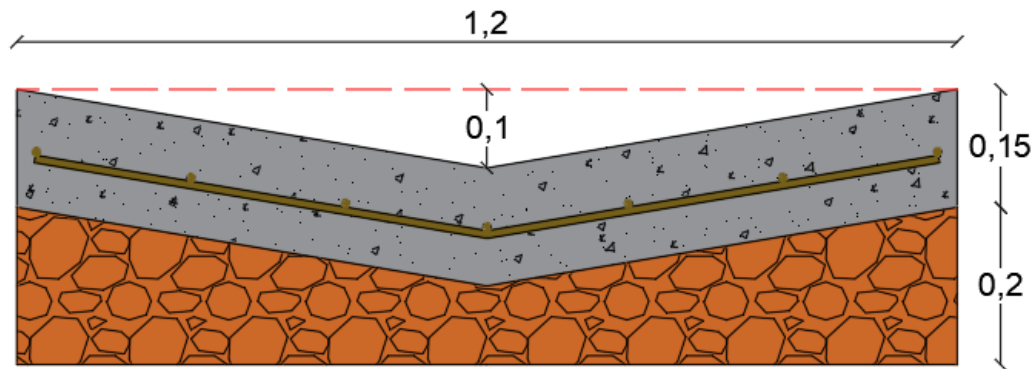

CONSORCIO FONTANA 2024
www.cali.gov.co/infraestructura



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI



COP16
CALI-COLOMBIA
Por Colombia



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI



COP16
CALI-COLOMBIA
Por con la Naturaleza

Gracias

por su atención



CONSORCIO FONTANA 2024

www.cali.gov.co/infraestructura

